


熊本競輪場の再建について

競輪事務所

1 現在の進捗について

(1) 解体工事の状況

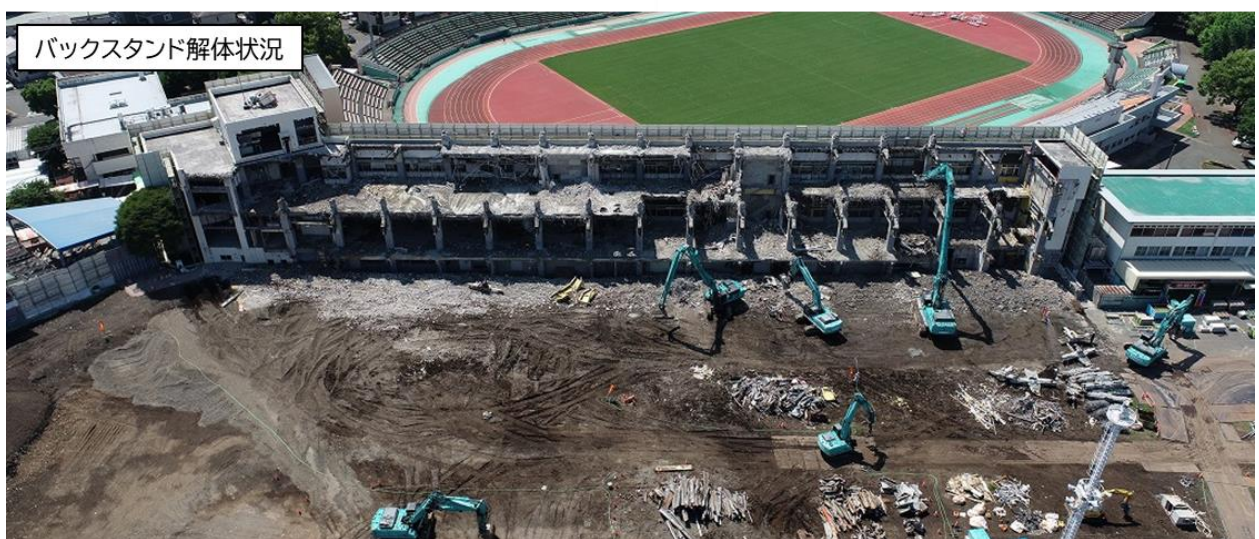

○進捗状況

- ・サイドスタンド・バンク：解体済（バンクの一部を除いて）
- ・バックスタンド：解体中

○工期

R 3 年 1 0 月～R 4 年 9 月

○費用

現契約額 5 5 0 百万円

※アスベスト除去範囲、産業廃棄物処理量の増加等に伴い、変更契約を予定
（現在、精査中）

(2) 設計の状況

○建設（建築・設備）工事の設計

R4・5年度の工事に係る設計については概ね完了。R6年度（第2期）の解体工事に係る設計を実施中。

○土木工事に係る設計

実施設計中（第1期工事分：8月、第2期工事分：12月完了予定）

<参考>概算事業費

現時点での概算事業費は概ね想定どおり。

項 目		内 容	R3	R4	R5	R6	合計
設計	建築設計	基本設計見直し及び詳細設計	88				88
	土木設計	基本設計見直し及び実施設計		50			50
施設解体	第1期	バック・サイドスタンド、バンク解体	220	380			600
	第2期	第2支払棟、周辺施設解体				167	167
建設工事		メインスタンド・選手管理棟改修、自転車競技練習棟増築等		1,120	1,680		2,800
土木工事	第1期	バンク・調整池、西側駐車場、変電設備等整備		420	630		1,050
	第2期	東側駐車場、北東側道路拡張、外構等				225	225
合 計			308	1,970	2,310	392	4,980

※既存建物の状況、資材単価上昇等により変動の可能性あり

※財源については競輪事業で賄う（基金、財産処分、起債）

2 今後の発注等予定について

(1) 建設工事

メインスタンド、選手管理棟等改修工事（建築・電気・機械設備）

7月頃入札 ⇒ R4年第3回定例会：契約議案 ⇒ 10月頃工事着手

(2) 土木工事

400Mバンク、雨水調整池等整備工事

9月頃入札 ⇒ R4年第4回定例会：契約議案 ⇒ 1月頃工事着手


(3) その他

照明灯、トータリゼータシステム等の機材

必要に応じ、第4回定例会で債務負担行為の補正予算を計上予定

3 スケジュール等について

(1) 再建整備スケジュール

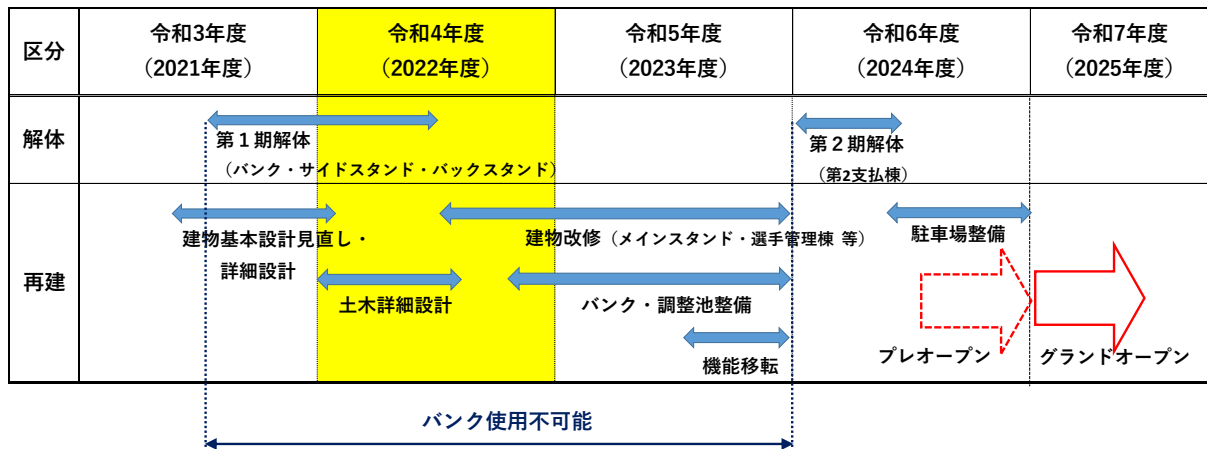

(2) 再建イメージ等

