資料１

令和8年度（2026年度）への予算繰越について〔上下水道局〕

1. 令和8年度への繰越額

（単位：千円）

	令和8年度への繰越 合計 A+B		建設改良費予算の繰越 A		維持管理費予算の繰越 B	
	金額	件数	金額	件数	金額	件数
水道事業	3,915,878	75 件	3,915,878	75件	0	0件
下水道事業	8,858,981	80 件	8,552,862	77件	306,119	3件
局合計	12,774,859	155 件	12,468,740	152件	306,119	3件

2. 建設改良費予算の繰越状況及び年次推移

繰越事由の見直しについて

○ 公共工事における**「施工時期の平準化」**が、令和元年６月に改正・施行された「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」及び「公共工事の品質確保の促進に関する法律」において明記されるとともに、令和６年度から建設業にも労働時間規制が本格適用された。
○ 計画的な発注に対する社会的要請の高まりに伴い、発注時期の調整を行う案件も増加していることから、従前の繰越事由の見直しを実施し、実態に即した整理とした。
○ 繰越事由を「繰越を想定していた案件」と「繰越を想定していなかった案件」に分類。
○「繰越を想定していた案件」は、さらに「国補正」に伴う案件と施工時期の平準化等の観点から計画段階から繰越を想定していた「計画的繰越など」に細分化。
○「繰越を想定していなかった案件」は、「関係者等との協議に時間を要した」、「入札不調による着工時期の遅れ」など、従前どおりの分類で整理。

（単位：千円）

				水道事業		下水道事業	
				件数、金額	割合	件数、金額	割合
繰越を想定していた案件	国補正	A	国の緊急対策に伴う事業で、国補正予算成立後の発注となった	32件	43%	8件	11%
				1,731,673	44%	485,040	5%
	計画的繰越など	B	計画段階から事業実施期間が12か月を超える	10件	13%	8件	10%
				613,698	16%	3,390,732	40%
		C	施工時期の平準化	2件	3%	28件	36%
				122,935	3%	2,786,830	33%
		D	年度中途で予算措置を行い適正な事業実施期間が年度内に収まらない	5件	7%	4件	5%
				81,336	2%	65,651	1%
	小計			49件	66%	48件	62%
				2,549,642	65%	6,728,253	79%
繰越を想定していなかった案件	入札不調・施工方法変更など	E	関係者等との協議に時間を要した	6件	8%	15件	20%
				195,393	5%	636,134	7%
		F	関連する他工事等の進捗の遅れや期間変更による影響	1件	1%	7件	9%
				95,117	2%	609,553	7%
		G	埋設物、土質等の影響によるルート・施工方法等の検討に時間を要した	11件	14%	5件	7%
				962,466	25%	496,895	6%
		H	入札不調による着工時期の遅れ	8件	11%	1件	1%
				113,260	3%	17,941	0%
		I	資材の調達に不測の時間を要した	0件		1件	1%
				0		64,086	1%
	小計			26件	34%	29件	38%
				1,366,236	35%	1,824,609	21%
合計				75件	100%	77件	100%
				3,915,878	100%	8,552,862	100%

水道事業会計

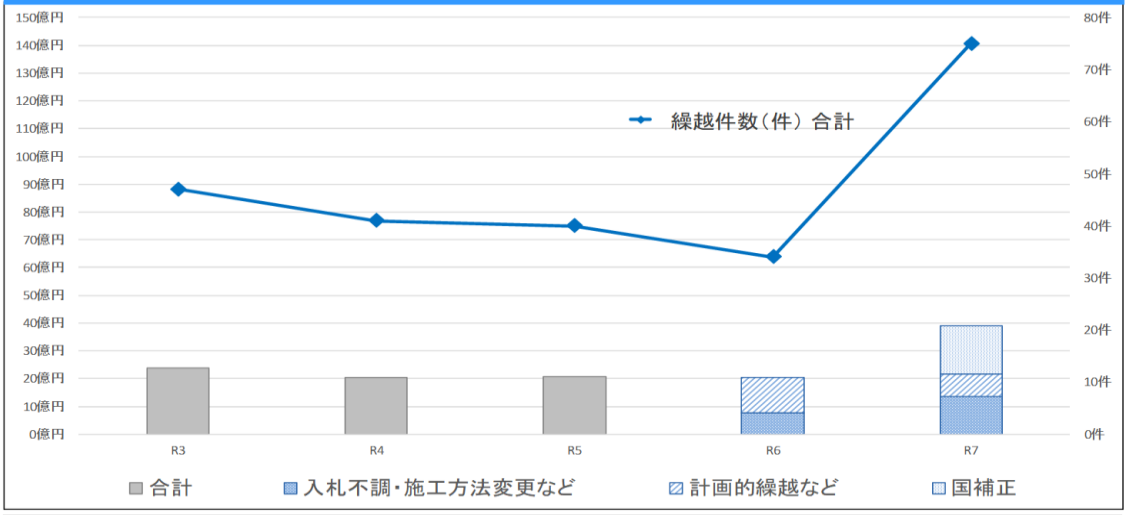

		R3	R4	R5	R6	R7
繰越件数（件）	国補正	―	―	―	0	32
	計画的繰越など	―	―	―	20	17
	入札不調・施工方法変更など	―	―	―	14	26
	合計	47	41	40	34	75
繰越額（億円）	国補正	―	―	―	0	17.3
	計画的繰越など	―	―	―	12.6	8.2
	入札不調・施工方法変更など	―	―	―	7.8	13.6
	合計	23.7	20.3	20.8	20.4	39.1

水道事業会計における前年度比較

○ 繰越額全体としては金額ベースで約１８億円、件数ベースで４１件の増。
○ 主な増加要因は、令和７年度国補正予算により措置された補助事業を新たに実施したもの（増加分のうち約１７億円（３２件）が国補正予算案件）。
○「繰越を想定していた・していなかった」の視点から、その事由別に集計すると、「繰越を想定していなかった案件」が占める件数の割合は前年度と比べて６%の減少となっている。

下水道事業会計

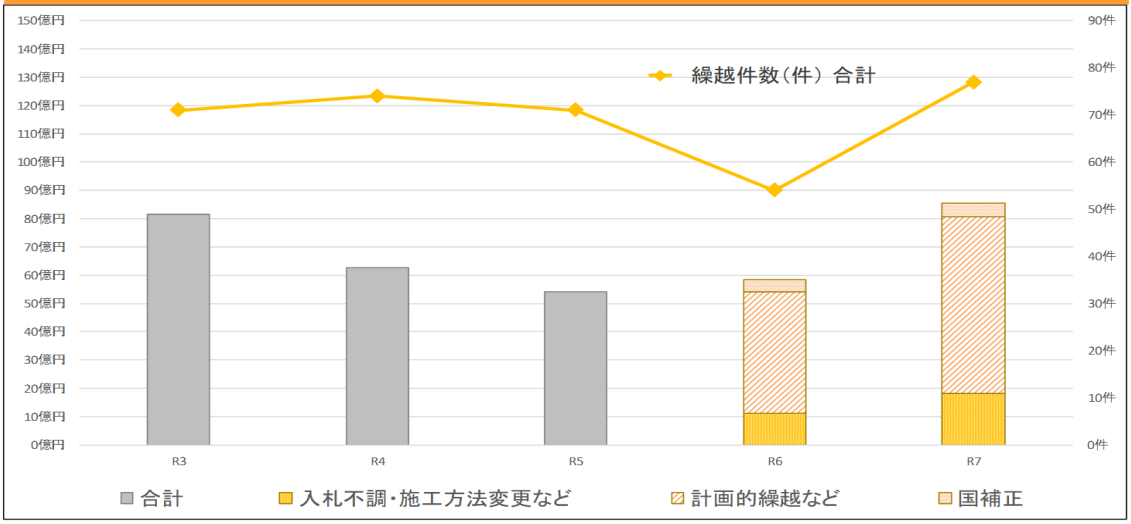

		R3	R4	R5	R6	R7
繰越件数（件）	国補正	―	―	―	4	8
	計画的繰越など	―	―	―	30	40
	入札不調・施工方法変更など	―	―	―	20	29
	合計	71	74	71	54	77
繰越額（億円）	国補正	―	―	―	4.1	4.9
	計画的繰越など	―	―	―	43.0	62.4
	入札不調・施工方法変更など	―	―	―	11.2	18.2
	合計	81.5	62.6	54.0	58.3	85.5

下水道事業会計における前年度比較

○ 繰越額全体としては金額ベースで約２７億円、件数ベースで２３件の増。
○ 増加分のうち「計画的繰越など」が金額ベースで約２０億円の増となっているが、施工時期の平準化の推進により、下半期から年度末において着工した案件が前年度に比べ増加したことが大きな要因となっている。
○「繰越を想定していた・していなかった」の視点から、その事由別に集計すると「繰越を想定していなかった案件」が占める件数の割合は前年度と比べて横ばいとなっている。

3. 前払金の支払状況

（単位：千円）

	水道事業			下水道事業		
前払額	翌年度繰越額	前払額	前払額の割合	翌年度繰越額	前払額	前払額の割合
	3,915,878	1,066,092	27%	8,858,981	2,487,968	28%

4. 事故繰越の状況

＜維持管理費予算＞

（単位：千円）

件　名	繰越額	繰越理由
【下水道事業】 中部浄化センターC消化槽浚渫業務	118,799	当初想定していなかった汚泥の繊維物による機材閉塞や細かな砂分の混入による機器故障によって作業日数が約3ヶ月増加したため。
【下水道事業】 世安ポンプ場ガスタービン発電機パワーモジュール取替工事	180,950	令和7年12月5日に実施した外注点検でパワーモジュール3台の破損が判明し、その調達及び交換作業等に相応の日数を要したため。
【下水道事業】 坪井ポンプ場汚水ポンプ井水位計その他取替工事	6,370	令和7年8月の大雨で浸水した坪井ポンプ場復旧にかかる国庫補助申請に必要な被害額の算定や関係資料の作成に時間を要したため。

報　　第　　１６　　号

令和 ８ 年 ６ 月 ５ 日提出

予算繰越計算書について

熊本市上下水道事業管理者から令和７年度熊本市水道事業会計予算繰越の使用に関する計画について、次のように報告があったので報告する。

熊本市長　　大　西　一　史

令和７年度熊本市水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第１項の規定による建設改良費の繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財源内訳			不用額	翌年度繰越額に係る繰越を要するたな卸資産の購入限度額	説明
						国（県）補助金	企業債	その他			
			円	円	円	円	円	円	円	円	
資本的支出	建設改良費	施設改良及び拡張事業	367,717,516	0	367,717,516	0	0	367,717,516	0	0	・国の緊急対策に伴う事業で、国補正予算成立後の発注となった 1,731,673,088円 ・埋設物、土質等の影響によるルート・施工方法等の検討に時間を要した 962,465,374円 ・計画段階から事業実施期間が12か月を超える 613,697,865円 ・関係者等との協議に時間を要した 195,393,253円 ・施工時期の平準化 122,934,900円 ・入札不調による着工時期の遅れ 113,259,818円 ・関連する他工事等の進捗の遅れや期間変更による影響 95,117,000円 ・年度中途で予算措置を行い適正な事業実施期間が年度内に収まらない 81,336,200円
		水道施設更新事業	4,083,386,239	964,695,429	3,118,690,810	345,871,922	2,390,948,938	381,869,950	0	0	
		第６次拡張事業	597,017,784	167,548,612	429,469,172	31,878,078	367,751,062	29,840,032	0	0	
合計			5,048,121,539	1,132,244,041	3,915,877,498	377,750,000	2,758,700,000	779,427,498	0	0	

令和７年度熊本市水道事業会計予算繰越計算書　付属説明資料

ア　施設改良及び拡張事業　　（単位　円）

番号	件　名	翌年度繰越額	うち前払額	工　期	不調・不落	説　明
1	麻生田送水場中央監視制御設備更新詳細設計業務委託	7,781,400		R7.5.8 R9.2.26		計画段階から事業実施期間が12か月を超える
2	託麻送水場中央監視制御設備更新詳細設計業務委託	9,933,000		R7.5.22 R9.2.26		計画段階から事業実施期間が12か月を超える
3	戸島送水場中央監視制御設備更新工事	144,241,786	140,000,000	R7.7.3 R9.2.26		計画段階から事業実施期間が12か月を超える
4	熊本市水道施設遠方監視制御設備更新詳細設計業務委託	15,741,000		R7.7.25 R9.2.26		計画段階から事業実施期間が12か月を超える
5	立田山配水池計装機器取替工事	69,080,000		R7.9.4 R8.6.19		埋設物、土質等の影響によるルート・施工方法等の検討に時間を要した
6	戸島送水場中央監視制御設備更新工事施工監理業務委託	3,643,200		R7.9.4 R9.2.26		計画段階から事業実施期間が12か月を超える
7	中無田水管橋補強設計及び行徳橋添架管撤去設計業務委託	16,731,830	4,180,000	R7.11.7 R8.7.31	有	入札不調による着工時期の遅れ
8	深井戸水中モータポンプ購入	1,045,000		R8.1.7 R8.6.30		年度中途で予算措置を行い適正な事業実施期間が年度内に収まらない
9	南区城南町沈目配水管布設工事	9,110,200		R8.1.27 R8.7.31	有	入札不調による着工時期の遅れ
10	北区麻生田４丁目６番付近配水管布設替工事	9,768,000		R8.3.23 R8.7.3		年度中途で予算措置を行い適正な事業実施期間が年度内に収まらない
11	北区植木町辺田野３７番付近配水管布設替工事	23,718,200		R8.3.26 R8.6.10		年度中途で予算措置を行い適正な事業実施期間が年度内に収まらない
12	南区海路口町２６番付近配水管布設替工事	33,055,000		R8.3.26 R8.9.18		年度中途で予算措置を行い適正な事業実施期間が年度内に収まらない
13	電動流入弁購入	10,118,900		R8.3.27 R8.11.30	有	入札不調による着工時期の遅れ
14	高遊原配水池３号水位計購入	13,750,000		R8.3.30 R8.6.30		年度中途で予算措置を行い適正な事業実施期間が年度内に収まらない
ア　施設改良及び拡張事業　小計		367,717,516	144,180,000			

イ　水道施設更新事業　　（単位　円）

番号	件　名	翌年度繰越額	うち前払額	工　期	不調・不落	説　明
1	中央区出水３丁目配水管布設替工事	85,554,700	51,320,000	R7.5.7 R8.5.26		埋設物、土質等の影響によるルート・施工方法等の検討に時間を要した
2	中央区中央街付近配水管布設替工事	63,855,000	38,311,000	R7.5.7 R8.5.29		埋設物、土質等の影響によるルート・施工方法等の検討に時間を要した
3	健軍水源地高圧電気設備及び配水設備更新工事に伴う基本設計業務委託	21,560,000		R7.5.22 R8.6.26		関係者等との協議に時間を要した
4	東区江津２丁目付近配水管布設替工事	94,369,000	56,610,000	R7.6.3 R8.8.28		埋設物、土質等の影響によるルート・施工方法等の検討に時間を要した
5	西区春日地区配水管布設替工事	97,900,000	36,000,000	R7.6.10 R8.5.29		埋設物、土質等の影響によるルート・施工方法等の検討に時間を要した
6	秋田配水場管路整備工事	129,757,766	205,760,000	R6.7.25 R8.5.22		埋設物、土質等の影響によるルート・施工方法等の検討に時間を要した

令和７年度熊本市水道事業会計予算繰越計算書　付属説明資料

イ　水道施設更新事業　　（単位　円）

番号	件　名	翌年度 繰越額	うち 前払額	工　期	不調・不落	説　明
7	西梶尾配水場高圧受変電設備更新詳細設計業務委託	24,184,624	6,435,000	R7.7.25 R8.5.29	有	入札不調による着工時期の遅れ
8	健軍水源地２号集水槽更新及び導水管布設工事	137,213,718	158,316,000	R7.7.25 R9.2.26		計画段階から事業実施期間が12か月を超える
9	中央区段山本町付近配水管布設替工事	64,680,000	25,872,000	R7.7.8 R8.4.30		関係者等との協議に時間を要した
10	南区内田町付近配水本管布設替工事	99,837,441	44,372,000	R7.8.20 R8.12.2		計画段階から事業実施期間が12か月を超える
11	南区富合町小岩瀬付近配水管布設替工事	95,117,000	38,046,000	R7.8.6 R8.10.30		関連する他工事等の進捗の遅れや期間変更による影響
12	西区新土河原２丁目付近配水管布設替工事に伴う測量設計業務委託	12,718,200		R7.8.8 R8.6.30		関係者等との協議に時間を要した
13	城山送水場～配水池（１号及び２号）間送水管布設替工事に伴う測量設計業務委託	13,207,884		R7.8.29 R8.7.10		埋設物、土質等の影響によるルート・施工方法等の検討に時間を要した
14	中央区大江６丁目付近配水管布設替工事	139,898,230	113,950,000	R6.9.3 R8.10.30		埋設物、土質等の影響によるルート・施工方法等の検討に時間を要した
15	秋田配水場配水管布設替工事に伴う測量設計業務委託	14,319,464	3,980,000	R7.10.6 R8.5.25	有	入札不調による着工時期の遅れ
16	健軍水源地取水井盤入出力電気設備更新工事	29,480,000	29,480,000	R7.10.9 R8.12.25		計画段階から事業実施期間が12か月を超える
17	中央区下通２丁目付近配水管布設替工事	64,296,320	64,290,000	R7.11.12 R9.2.26	有	計画段階から事業実施期間が12か月を超える
18	秋田第１水源地施設更新に伴う詳細設計業務委託	11,220,000		R7.11.28 R8.6.15	有	入札不調による着工時期の遅れ
19	一本木水源地（深２号井)更新工事	60,500,000	24,200,000	R7.12.10 R8.11.10		施工時期の平準化
20	中央区鍛冶屋町付近配水管布設替工事に伴う測量設計業務委託	35,998,600		R8.1.16 R9.1.29		関係者等との協議に時間を要した
21	南区城南町沈目配水管布設他3件工事	7,769,300		R8.1.27 R8.7.31	有	入札不調による着工時期の遅れ
22	中央区中唐人町付近配水管布設替工事	62,434,900	24,970,000	R8.3.4 R8.11.9		施工時期の平準化
23	南区富合町南田尻付近配水管布設替工事	101,530,000		R8.3.11 R9.2.26	有	計画段階から事業実施期間が12か月を超える
24	健軍取水７号井ケーシング更新工事	55,000,000		R8.3.11 R8.8.28		関係者等との協議に時間を要した
25	南区田井島１丁目配水管布設替工事	47,685,000		R8.3.26 R8.11.5		国の緊急対策に伴う事業で、国補正予算成立後の発注となった
26	中央区本荘３丁目付近配水管布設替工事	105,842,000		R8.3.27 R9.2.26		国の緊急対策に伴う事業で、国補正予算成立後の発注となった
27	西区花園４丁目付近配水管布設替工事	77,911,900				国の緊急対策に伴う事業で、国補正予算成立後の発注となった
28	中央区本荘４丁目（国道２６６号）配水管布設替工事	184,361,100				国の緊急対策に伴う事業で、国補正予算成立後の発注となった

令和７年度熊本市水道事業会計予算繰越計算書　付属説明資料

イ　水道施設更新事業　　（単位　円）

番号	件　名	翌年度繰越額	うち前払額	工　期	不調・不落	説　明
29	中央区新屋敷１丁目付近（産業道路）配水管布設替工事	107,260,000				国の緊急対策に伴う事業で、国補正予算成立後の発注となった
30	中央区大江１丁目付近（産業道路）配水管布設替工事	43,557,800				国の緊急対策に伴う事業で、国補正予算成立後の発注となった
31	中央区水前寺６丁目付近配水管布設替工事	31,796,600				国の緊急対策に伴う事業で、国補正予算成立後の発注となった
32	中央区神水本町付近配水管布設替工事	92,920,300				国の緊急対策に伴う事業で、国補正予算成立後の発注となった
33	中央区新大江１丁目付近配水管布設替工事	26,548,500				国の緊急対策に伴う事業で、国補正予算成立後の発注となった
34	中央区新大江１丁目（県立劇場通り）配水管布設替工事	318,476,400				国の緊急対策に伴う事業で、国補正予算成立後の発注となった
35	中央区新屋敷３丁目付近（産業道路）配水管布設替工事	47,617,604				国の緊急対策に伴う事業で、国補正予算成立後の発注となった
36	西区春日７丁目配水管布設替工事	45,534,815				国の緊急対策に伴う事業で、国補正予算成立後の発注となった
37	中央区水前寺４丁目付近配水管布設替工事	31,824,372				国の緊急対策に伴う事業で、国補正予算成立後の発注となった
38	東区保田窪本町配水管布設替工事	24,624,844				国の緊急対策に伴う事業で、国補正予算成立後の発注となった
39	中央区本荘付近配水管布設替工事	119,020,236				国の緊急対策に伴う事業で、国補正予算成立後の発注となった
40	中央区琴平２丁目配水管布設替工事	82,082,922				国の緊急対策に伴う事業で、国補正予算成立後の発注となった
41	西区花園１丁目付近配水管布設替工事	28,560,344				国の緊急対策に伴う事業で、国補正予算成立後の発注となった
42	西区河内町野出付近配水管布設替工事	25,064,726				国の緊急対策に伴う事業で、国補正予算成立後の発注となった
43	東区錦ヶ丘付近配水管布設替工事	13,094,569				国の緊急対策に伴う事業で、国補正予算成立後の発注となった
44	中央区新町４丁目付近配水管布設替工事	49,884,592				国の緊急対策に伴う事業で、国補正予算成立後の発注となった
45	西区河内町白浜付近（国道５０１号）配水管布設替工事	21,801,598				国の緊急対策に伴う事業で、国補正予算成立後の発注となった
46	西区河内町岳付近配水管布設替工事	9,357,695				国の緊急対策に伴う事業で、国補正予算成立後の発注となった
47	南区浜口町付近配水管布設替工事	4,860,746				国の緊急対策に伴う事業で、国補正予算成立後の発注となった
48	北区高平３丁目他配水管布設替工事に伴う地質調査業務委託	5,400,000				国の緊急対策に伴う事業で、国補正予算成立後の発注となった
49	中央区琴平２丁目他配水管布設替工事に伴う地質調査業務委託	5,400,000				国の緊急対策に伴う事業で、国補正予算成立後の発注となった
50	北区高平３丁目他配水管布設替工事に伴う測量設計業務委託	8,659,000				国の緊急対策に伴う事業で、国補正予算成立後の発注となった

令和７年度熊本市水道事業会計予算繰越計算書　付属説明資料

イ　水道施設更新事業　　（単位　円）

番号	件　名	翌年度繰越額	うち前払額	工　期	不調・不落	説　明
51	中央区南熊本２丁目他配水管布設替工事に伴う測量設計業務委託	10,565,000				国の緊急対策に伴う事業で、国補正予算成立後の発注となった
52	中央区大江５丁目配水管布設替工事に伴う測量設計業務委託	6,960,000				国の緊急対策に伴う事業で、国補正予算成立後の発注となった
53	中央区世安２丁目他配水管布設替工事に伴う測量設計業務委託	7,026,000				国の緊急対策に伴う事業で、国補正予算成立後の発注となった
54	中央区琴平２丁目他配水管布設替工事に伴う測量設計業務委託	7,320,000				国の緊急対策に伴う事業で、国補正予算成立後の発注となった
55	西区花園１丁目配水管布設替工事に伴う測量設計業務委託	5,270,000				国の緊急対策に伴う事業で、国補正予算成立後の発注となった
イ　水道施設更新事業　小計		3,118,690,810	921,912,000			

ウ　第６次拡張事業　　（単位　円）

番号	件　名	翌年度繰越額	うち前払額	工　期	不調・不落	説　明
1	横山配水池整備事業発注方式検討業務委託	5,436,453		R7.6.11 R8.7.31		関係者等との協議に時間を要した
2	南区城南町島田付近配水管布設工事に伴う測量設計業務委託	27,638,094		R7.8.18 R8.6.18		埋設物、土質等の影響によるルート・施工方法等の検討に時間を要した
3	南部送水場流量計その他更新工事	36,245,000		R7.11.7 R8.7.31		埋設物、土質等の影響によるルート・施工方法等の検討に時間を要した
4	南区城南町沈目配水管布設工事	19,805,500		R8.1.27 R8.7.31	有	入札不調による着工時期の遅れ
5	西区上代７丁目（都市計画道路熊本西環状線）付近配水管布設替工事	204,959,700		R7.2.27 R8.5.29		埋設物、土質等の影響によるルート・施工方法等の検討に時間を要した
6	南区元三町付近配水管布設工事	135,384,425		R8.3.4 R9.2.26		国の緊急対策に伴う事業で、国補正予算成立後の発注となった
ウ　第６次拡張事業　小計		429,469,172				
合　　計		3,915,877,498	1,066,092,000			

報　　第　　１７　　号

令和 ８ 年 ６ 月 ５ 日提出

予算繰越計算書について

熊本市上下水道事業管理者から令和７年度熊本市下水道事業会計予算繰越の使用に関する計画について、次のように報告があったので報告する。

熊本市長　　大　西　一　史

令和７年度熊本市下水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第１項の規定による建設改良費の繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財源内訳			不用額	翌年度繰越額に係る繰越を要するたな卸資産の購入限度額	説明
						国（県）補助金	企業債	その他			
			円	円	円	円	円	円	円	円	
資本的支出	建設改良費	未普及解消事業	3,047,038,714	82,516,544	2,964,522,170	0	2,962,800,000	1,722,170	0	0	・計画段階から事業実施期間が12か月を超える 3,390,731,903円 ・施工時期の平準化 2,786,830,200円 ・関係者等との協議に時間を要した 636,133,578円 ・関連する他工事等の進捗の遅れや期間変更による影響 609,552,513円 ・埋設物、土質等の影響によるルート・施工方法等の検討に時間を要した 496,895,233円 ・国の緊急対策に伴う事業で、国補正予算成立後の発注となった 485,040,000円 ・年度中途で予算措置を行い適正な事業実施期間が年度内に収まらない 65,650,640円 ・資材の調達に不測の時間を要した 64,086,000円 ・入札不調による着工時期の遅れ 17,941,000円
		改築更新・耐震化事業	1,598,101,772	84,446,339	1,513,655,433	336,056,910	722,000,000	455,598,523	0	0	
		その他下水道事業	1,364,936,254	191,927,230	1,173,009,024	536,862,090	474,100,000	162,046,934	0	0	
	建設改良費（雨水）	浸水対策事業	3,563,899,446	662,225,006	2,901,674,440	1,431,190,000	1,470,400,000	84,440	0	0	
合計			9,573,976,186	1,021,115,119	8,552,861,067	2,304,109,000	5,629,300,000	619,452,067	0	0	

令和７年度熊本市下水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第２項ただし書の規定による事故繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財源内訳			不用額	翌年度繰越額に係る繰越を要するたな卸資産の購入限度額	説明
						国（県）補助金	企業債	その他			
			円	円	円	円	円	円	円	円	
下水道事業費用	営業費用	中部浄化センターC消化槽浚渫業務	118,798,585	0	118,798,585	0	0	118,798,585	0	0	当初想定していなかった作業中の機械故障により業務に時間を要したもの
		世安ポンプ場ガスタービン発電機パワーモジュール取替工事	180,950,000	0	180,950,000	0	0	180,950,000	0	0	年度途中に破損が判明し、年度内の修繕が不可能であったもの
		坪井ポンプ場汚水ポンプ井水位計その他取替工事	6,369,440	0	6,369,440	4,242,000	2,100,000	27,440	0	0	災害復旧の補助金申請に必要な被害額の算定に時間を要したもの
合計			306,118,025	0	306,118,025	4,242,000	2,100,000	299,776,025	0	0	

令和７年度熊本市下水道事業会計予算繰越計算書　付属説明資料

ア　未普及解消事業　　（単位　円）

番号	件　　名	翌年度 繰越額	うち 前払額	工　期	不調・不落	説　明
1	中央汚水幹線及び枝線外設計業務委託	28,985,291	8,100,000	R7.4.25 R8.5.29		関係者等との協議に時間を要した
2	南部汚水２０号幹線枝線外下水道築造工事	152,631,480	53,169,600	R7.5.7 R8.5.27		関係者等との協議に時間を要した
3	西部汚水１７号幹線及び枝線下水道築造工事	141,938,977	40,000,000	R7.5.7 R8.4.30		埋設物、土質等の影響によるルート・施工方法等の検討に時間を要した
4	富合西部汚水１号幹線及び枝線下水道築造工事	158,320,256	49,100,000	R7.5.7 R8.5.29		埋設物、土質等の影響によるルート・施工方法等の検討に時間を要した
5	五霊汚水幹線及び枝線外詳細設計業務委託	23,907,400		R7.5.8 R8.7.31		関係者等との協議に時間を要した
6	熊本市公共下水道事業計画変更及び設計業務委託	7,871,050	2,361,000	R7.6.12 R8.7.31		関連する他工事等の進捗の遅れや期間変更による影響
7	中央汚水幹線枝線下水道築造その他工事	26,737,393	41,712,000	R7.7.1 R9.2.26		計画段階から事業実施期間が12か月を超える
8	西部汚水１２号幹線枝線外詳細設計修正業務委託	17,195,635	5,100,000	R7.7.3 R8.4.30		関係者等との協議に時間を要した
9	万楽寺町Ｎｏ．１マンホールポンプ場外２箇所主ポンプ機械設備その他工事	34,268,788		R7.7.8 R8.8.31		関連する他工事等の進捗の遅れや期間変更による影響
10	西部汚水１７号幹線及び枝線下水道築造工事	178,805,000	71,520,000	R7.7.23 R8.7.10		施工時期の平準化
11	大和広住汚水幹線枝線外下水道築造工事	63,938,600	25,570,000	R7.8.20 R8.5.29		関係者等との協議に時間を要した
12	西部汚水２２号幹線及び枝線外下水道築造工事	153,989,000	61,590,000	R7.9.9 R8.9.4		施工時期の平準化
13	赤見汚水幹線枝線外詳細設計業務委託	16,687,000	5,000,000	R7.9.25 R8.5.26		施工時期の平準化
14	中部汚水１号幹線枝線下水道築造工事	116,820,000	46,000,000	R7.10.22 R8.10.16		施工時期の平準化
15	五霊汚水幹線枝線外設計業務委託	18,152,200		R7.10.27 R8.5.29		関係者等との協議に時間を要した
16	西部汚水１７号幹線枝線下水道築造工事	117,337,000	46,900,000	R7.10.29 R8.7.17		施工時期の平準化
17	南部汚水２０号幹線枝線下水道築造工事	99,122,100	39,640,000	R7.11.12 R8.10.23		施工時期の平準化
18	中部汚水１号幹線枝線外下水道築造工事に伴う建物等事前調査業務委託	9,141,000		R8.1.23 R8.5.11		施工時期の平準化
19	中部汚水２４号幹線枝線下水道築造工事	58,465,000	23,386,000	R8.1.28 R8.9.4		施工時期の平準化
20	西部汚水２２号幹線枝線外下水道築造工事	140,877,000	56,300,000	R8.1.28 R9.1.21		施工時期の平準化
21	西部汚水２２号幹線及び枝線外下水道築造工事	98,634,800	39,450,000	R8.2.18 R8.12.4		施工時期の平準化
22	西部汚水２２号幹線枝線外下水道築造工事	117,788,000	47,110,000	R8.2.26 R9.2.12		施工時期の平準化

令和７年度熊本市下水道事業会計予算繰越計算書　付属説明資料

ア　未普及解消事業　　（単位　円）

番号	件　　名	翌年度繰越額	うち前払額	工　期	不調・不落	説　明
23	五霊汚水幹線枝線外詳細設計業務委託	18,346,900	5,500,000	R8.2.27 R8.10.28		施工時期の平準化
24	中部汚水１号幹線枝線下水道築造工事	145,750,000	58,300,000	R8.3.4 R9.2.26		施工時期の平準化
25	西部汚水１２号幹線枝線下水道築造工事	121,878,900		R8.3.26 R8.11.30		施工時期の平準化
26	西部汚水２２号幹線及び枝線下水道築造工事	132,110,000		R8.3.26 R8.12.4		施工時期の平準化
27	西部汚水２２号幹線枝線下水道築造工事	85,488,700		R8.3.26 R8.12.11		施工時期の平準化
28	赤見汚水幹線枝線外下水道築造工事	80,960,000		R8.3.26 R9.1.14		施工時期の平準化
29	富合西部汚水１号幹線及び枝線下水道築造工事	113,696,000		R8.3.26 R9.1.15		施工時期の平準化
30	西部汚水２２号幹線枝線下水道築造工事	112,178,000		R8.3.26 R9.1.29		施工時期の平準化
31	赤見汚水幹線及び枝線下水道築造工事	144,650,000	50,000,000	R8.3.26 R9.1.29		施工時期の平準化
32	西部汚水２２号幹線枝線下水道築造工事	128,850,700		R8.3.26 R9.2.2		施工時期の平準化
33	西部汚水２２号幹線枝線下水道築造工事	99,000,000		R8.3.26 R9.2.26		施工時期の平準化
ア　未普及解消事業　小計		2,964,522,170	775,808,600			

イ　改築更新・耐震化事業　　（単位　円）

番号	件　　名	翌年度繰越額	うち前払額	工　期	不調・不落	説　明
1	平田ポンプ場外２箇所沈砂池機械設備その他工事	240,322,661	110,000,000	R7.3.21 R9.2.12		関連する他工事等の進捗の遅れや期間変更による影響
2	熊本市下水道施設台帳システムデータ移行等業務委託	34,100,000		R7.6.17 R8.6.19		関係者等との協議に時間を要した
3	南部浄化センターＮｏ．３送風機外１箇所電気設備工事	242,000,000	96,800,000	R7.7.3 R9.2.22	有	計画段階から事業実施期間が12か月を超える
4	南部浄化センターＮｏ．３送風機機械設備工事	79,000,000		R7.7.3 R9.2.22		計画段階から事業実施期間が12か月を超える
5	熊本市下水道ストックマネジメント計画（第3期）策定支援業務委託	32,262,772	9,174,000	R7.8.1 R8.4..30		関係者等との協議に時間を要した
6	公共下水道（城東C地区外）管渠改築工事	159,654,000	63,861,000	R7.8.4 R8.4..17		埋設物、土質等の影響によるルート・施工方法等の検討に時間を要した
7	新花畑ポンプ場監視操作卓更新工事	25,850,000		R7.8.5 R8.12.12		計画段階から事業実施期間が12か月を超える
8	公共下水道管渠改築（城東E地区外）詳細設計業務委託	24,087,800		R7.9.4 R8.5.8		埋設物、土質等の影響によるルート・施工方法等の検討に時間を要した

令和７年度熊本市下水道事業会計予算繰越計算書　付属説明資料

イ　改築更新・耐震化事業　　（単位　円）

番号	件　　名	翌年度繰越額	うち前払額	工　期	不調・不落	説　明
9	南部浄化センター消化タンク設備詳細設計業務委託	12,894,200		R7.9.25 R8.6.29	有	埋設物、土質等の影響によるルート・施工方法等の検討に時間を要した
10	和泉ポンプ場脱臭装置取替工事	22,000,000	8,800,000	R7.11.28 R8.9.4		年度中途で予算措置を行い適正な事業実施期間が年度内に収まらない
11	東部浄化センター水処理受変電設備その他詳細設計業務委託	43,169,500		R8.2.27 R8.10.30		施工時期の平準化
12	沼山津ポンプ場外１箇所汚水ポンプ機械設備その他工事	201,300,000	80,520,000	R8.2.27 R9.2.26		施工時期の平準化
13	坪井ポンプ場非常用発電機設置に伴う詳細設計業務委託	3,531,000		R8.3.19 R8.6.30		年度中途で予算措置を行い適正な事業実施期間が年度内に収まらない
14	東部浄化センターA系照明設備改修修正設計業務委託	1,463,000		R8.3.19 R8.9.14		施工時期の平準化
15	沼山津ポンプ場外２箇所汚水ポンプ電気設備その他工事	64,980,500		R8.3.26 R9.2.26	有	施工時期の平準化
16	一時避難所～処理場（田迎西小・湖東中・出水中）耐震化工事	225,000,000				国の緊急対策に伴う事業で、国補正予算成立後の発注となった
17	上下水道耐震化基礎調査（耐震診断）業務委託	15,000,000				国の緊急対策に伴う事業で、国補正予算成立後の発注となった
18	災害拠点病院～処理場（中央病院）耐震補強設計	20,000,000				国の緊急対策に伴う事業で、国補正予算成立後の発注となった
19	城南町浄化センター機械棟耐震補強設計及び第３者評価機関審査業務委託	33,540,000				国の緊急対策に伴う事業で、国補正予算成立後の発注となった
20	江津ポンプ場耐震補強設計及び第３者評価機関審査業務委託	33,500,000				国の緊急対策に伴う事業で、国補正予算成立後の発注となった
イ　改築更新・耐震化事業　小計		1,513,655,433	369,155,000			

ウ　その他下水道事業　　（単位　円）

番号	件　　名	翌年度繰越額	うち前払額	工　期	不調・不落	説　明
1	東部浄化センター下水汚泥由来繊維利活用システム電気設備設置工事	54,623,863		R6.10.18 R8.9.17	有	関連する他工事等の進捗の遅れや期間変更による影響
2	東部浄化センター下水汚泥由来繊維利活用システム機械設備設置工事	230,770,101		R6.10.18 R8.9.17	有	関連する他工事等の進捗の遅れや期間変更による影響
3	熊本市下水汚泥処理処分計画策定及び設計業務委託	20,840,600		R7.6.12 R8.5.29		関係者等との協議に時間を要した
4	熊本市下水道施設管理における官民連携手法検討業務委託	26,400,000		R7.6.30 R8.6.30		関係者等との協議に時間を要した
5	熊本市公共下水道施設耐水化計画変更策定及び設計業務委託	17,941,000		R7.9.4 R8.5.29	有	入札不調による着工時期の遅れ
6	田底中部山東東部接続幹線下水道築造工事	119,556,800	71,700,000	R7.9.9 R8.7.13		関係者等との協議に時間を要した
7	不明水対策（東部処理区：若葉地区）管渠更生工事	64,086,000		R7.10.15 R8.4..24		資材の調達に不測の時間を要した

令和７年度熊本市下水道事業会計予算繰越計算書　付属説明資料

ウ　その他下水道事業　　（単位　円）

番号	件　　名	翌年度繰越額	うち前払額	工　期	不調・不落	説　明
8	都市計画事業　城南町浄化センター水処理施設築造工事	255,328,920	113,470,000	R7.10.17 R9.3.17		計画段階から事業実施期間が12か月を超える
9	豪雨災害に伴う坪井ポンプ場受配電設備基礎工事	14,839,000		R8.2.16 R8.5.29		年度中途で予算措置を行い適正な事業実施期間が年度内に収まらない
10	シリンダヘッドほか１件の購入	25,280,640		R8.3.16 R8.12.25		年度中途で予算措置を行い適正な事業実施期間が年度内に収まらない
11	田底中部山東東部接続幹線外下水道築造工事	160,782,600	64,310,000	R8.3.26 R9.2.15		施工時期の平準化
12	沼山津ポンプ場外２箇所汚水ポンプ電気設備その他工事	24,559,500		R8.3.26 R9.2.26	有	施工時期の平準化
13	下水道総合地震対策（マンホールトイレ）整備工事	130,000,000				国の緊急対策に伴う事業で、国補正予算成立後の発注となった
14	下水道総合地震対策（マンホールトイレ）測量設計業務委託	17,000,000				国の緊急対策に伴う事業で、国補正予算成立後の発注となった
15	マンホールトイレ資機材購入	11,000,000				国の緊急対策に伴う事業で、国補正予算成立後の発注となった
ウ　その他下水道事業　小計		1,173,009,024	249,480,000			

エ　浸水対策事業　　（単位　円）

番号	件　　名	翌年度繰越額	うち前払額	工　期	不調・不落	説　明
1	井芹川第8･10排水区雨水ポンプ場築造工事委託に関する協定（その1）	1,043,318,000		R5.4.17 R9.9.30		計画段階から事業実施期間が12か月を超える
2	井芹川第8･10排水区雨水ポンプ場築造工事委託に関する協定（その2）	1,121,359,000	483,840,000	R6.6.6 R9.9.30		計画段階から事業実施期間が12か月を超える
3	鶯川第２排水区雨水管渠築造工事（２期工事）	597,138,590	500,000,000	R6.9.26 R9.1.29		計画段階から事業実施期間が12か月を超える
4	下水道浸水対策（城東地区）に係る花畑第２ポンプ場移設ほか基本設計業務委託（第781号）	33,825,000	10,147,000	R7.4.16 R8.6.30		関連する他工事等の進捗の遅れや期間変更による影響
5	熊本市公共下水道事業計画変更及び設計業務委託（第７８５号）※雨水分	7,871,050	2,361,000	R7.6.12 R8.7.31		関連する他工事等の進捗の遅れや期間変更による影響
6	都市計画事業　加勢川第５排水区浸水対策施設水理模型実験設計業務委託	45,053,700	10,516,000	R7.7.25 R8.9.30		関係者等との協議に時間を要した
7	都市計画事業　木部川第６排水区浸水対策施設基本設計及び水理模型実験業務委託	39,034,600	11,710,000	R7.7.25 R8.9.30		関係者等との協議に時間を要した
8	熊本市雨水出水浸水想定設計業務委託	5,494,500		R7.8.18 R8.5.29		関係者等との協議に時間を要した
9	都市計画事業　鶯川第２排水区浸水対策施設修正設計業務委託	8,580,000	2,570,000	R7.10.28 R8.8.31		関係者等との協議に時間を要した
エ　浸水対策事業　小計		2,901,674,440	1,021,144,000			
合　　計		8,552,861,067	2,415,587,600			

令和７年度熊本市下水道事業会計予算繰越計算書　付属説明資料

オ　下水道事業費用（事故繰越）　　（単位　円）

番号	件　　名	翌年度 繰越額	うち 前払額	工　期	不調・不落	説　明
1	中部浄化センターC消化槽浚渫業務	118,798,585		R7.10.7 R8.6.30		当初想定していなかった作業中の機械故障により業務に時間を要したもの
2	世安ポンプ場ガスタービン発電機パワーモジュール取替工事	180,950,000	72,380,000	R8.1.23 R8.5.29		年度途中に破損が判明し、年度内の修繕が不可能であったもの
3	坪井ポンプ場汚水ポンプ井水位計その他取替工事	6,369,440		R8.2.27 R8.8.31		災害復旧の補助金申請に必要な被害額の算定に時間を要したもの
オ　下水道事業費用（事故繰越）　小計		306,118,025	72,380,000			
事故繰越　　合計		306,118,025	72,380,000			
